



NOVÝ JADERNÝ ZDROJ DUKOVANY

ELEKTRÁRNA DUKOVANY II, A. S.; SKUPINA ČEZ
21. BŘEZEN 2022

ING. PETR ZÁVODSKÝ
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
PETR.ZAVODSKY@CEZ.CZ

**ČISTÁ
ENERGIE
ZÍTRKA** ●●●●

A thin green line that starts from the end of the 'ČISTÁ ENERGIE ZÍTRKA' text and extends horizontally across the page, ending in a wavy line that curves upwards towards the right, where it meets the stem of a stylized green plant.



NOVÝ JADERNÝ PROJEKT JE V PRVNÍ PŘÍPRAVNÉ FÁZI POKRYTÉ PODEPSANOU PRVNÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVOU (PPS)

Fáze	Datum konec	ČEZ Očekávané náklady (mld. EUR)	Stát Očekávané náklady* (mld. EUR)	Povolení a licence	Smlouva s dodavatelem technologie
A 1. Příprava, výběr dodavatele	2024	~0,2		EIA** Povolení k umístění jaderného zařízení Územní řízení	Výběrové řízení a podpis smlouvy B
2. Projektování povolování a licencování	2029		~0,7	Stavební řízení Stavební povolení	"LWA - Limited Work Authorization" fáze
3. Výstavba, uvedení do provozu	2036	1,8***	~5,1	Licence k zahájení zkušebnímu provozu	Výstavba C
4. Zkušební provoz	2038			Provozní licence	Provoz ve zkušebním období

- A** Rámcová smlouva
- B** První prováděcí smlouva (PPS)
- C** PPA - Smlouva o nákupu energie (bude rozhodnuto)
RFA - návratná finanční pomoc (bude rozhodnuto)
Investorská smlouva (bude rozhodnuto)

* V cenách roku 2020, zaokrouhleno

** EIA = Environmental Impact Assessment

*** Rezerva na pokrytí nákladů na neoprávněné důvody – bude případně čerpána průběžně





KONTROLA STÁTU NAD VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

- Stát je oprávněn sdělovat EDU II **požadavky nebo připomínky k dokumentaci** k Výběrovému řízení.
- Stát na základě usnesení vlády prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu nebo Ministrem pověřené osoby písemně sdělí EDU II a ČEZ případné **dodatečné Bezpečnostní požadavky**.
- EDU II a ČEZ jsou povinny v rámci přípravy a provedení Výběrového řízení plně umožnit kontrolu a zajištění základních bezpečnostních zájmů České republiky, zejména formou zajištění **přístupu ke všem relevantním informacím**.
- Stát má právo v průběhu výběrového řízení (včetně Hodnotící zprávy) na základě usnesení vlády prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu **vyřadit či odmítnout z bezpečnostních důvodů jakéhokoliv uchazeče** (hlavního dodavatele, konsorcium či člena konsorcia).



PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

- **Zahájení výběrového řízení** **17.03.2022**
- **Obdržení nabídek (Initial Bids)** **30.11.2022**
- Analýza nabídek uchazečů 3/2023
- Jednání o nabídkách 7/2023
- Aktualizace nabídek po jednáních (Updated Initial Bids) 9/2023
- Vyhodnocení aktualizovaných nabídek a stanovení pořadí 12/2023
- **Předložení oznámení o vyhodnocení nabídek Státu** **12/2023**
- **Vyjádření Státu k Oznámení o vyhodnocení nabídek (50 prac. dní)** **3/2024**
- Jednání o nabídce s preferovaným dodavatelem 10/2024
- **EPC smlouva připravena k podpisu** **12/2024**




PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

	2022				2023				2024				
Vydání poptávkové dokumentace, výzva k podání nabídek	◆												
Zpracování nabídek uchazeči													
Předání iniciačních nabídek				◆									
Analýza nabídek a příprava na jednání s uchazeči													
Jednání s uchazeči													
Výzva k podání aktualizovaných nabídek													
Zpracování aktualizovaných nabídek uchazeči													
Předání aktualizovaných nabídek													
Hodnocení aktualizovaných nabídek													
Oznámení o vyhodnocení nabídek předloženo Státu													
Příprava na jednání s preferovaným dodavatelem													
Vyjádření státu k oznámení o vyhodnocení nabídek													
Oznámení preferovaného dodavatele a výzva k podání doplněné nabídky													
Finalizace smlouvy s preferovaným dodavatelem vč. výběru / potvrzení hlavních poddodavatelů													
Smlouva s dodavatelem projednána a připravená k podpisu													◆



HARMONOGRAM PROJEKTU - REALIZACE

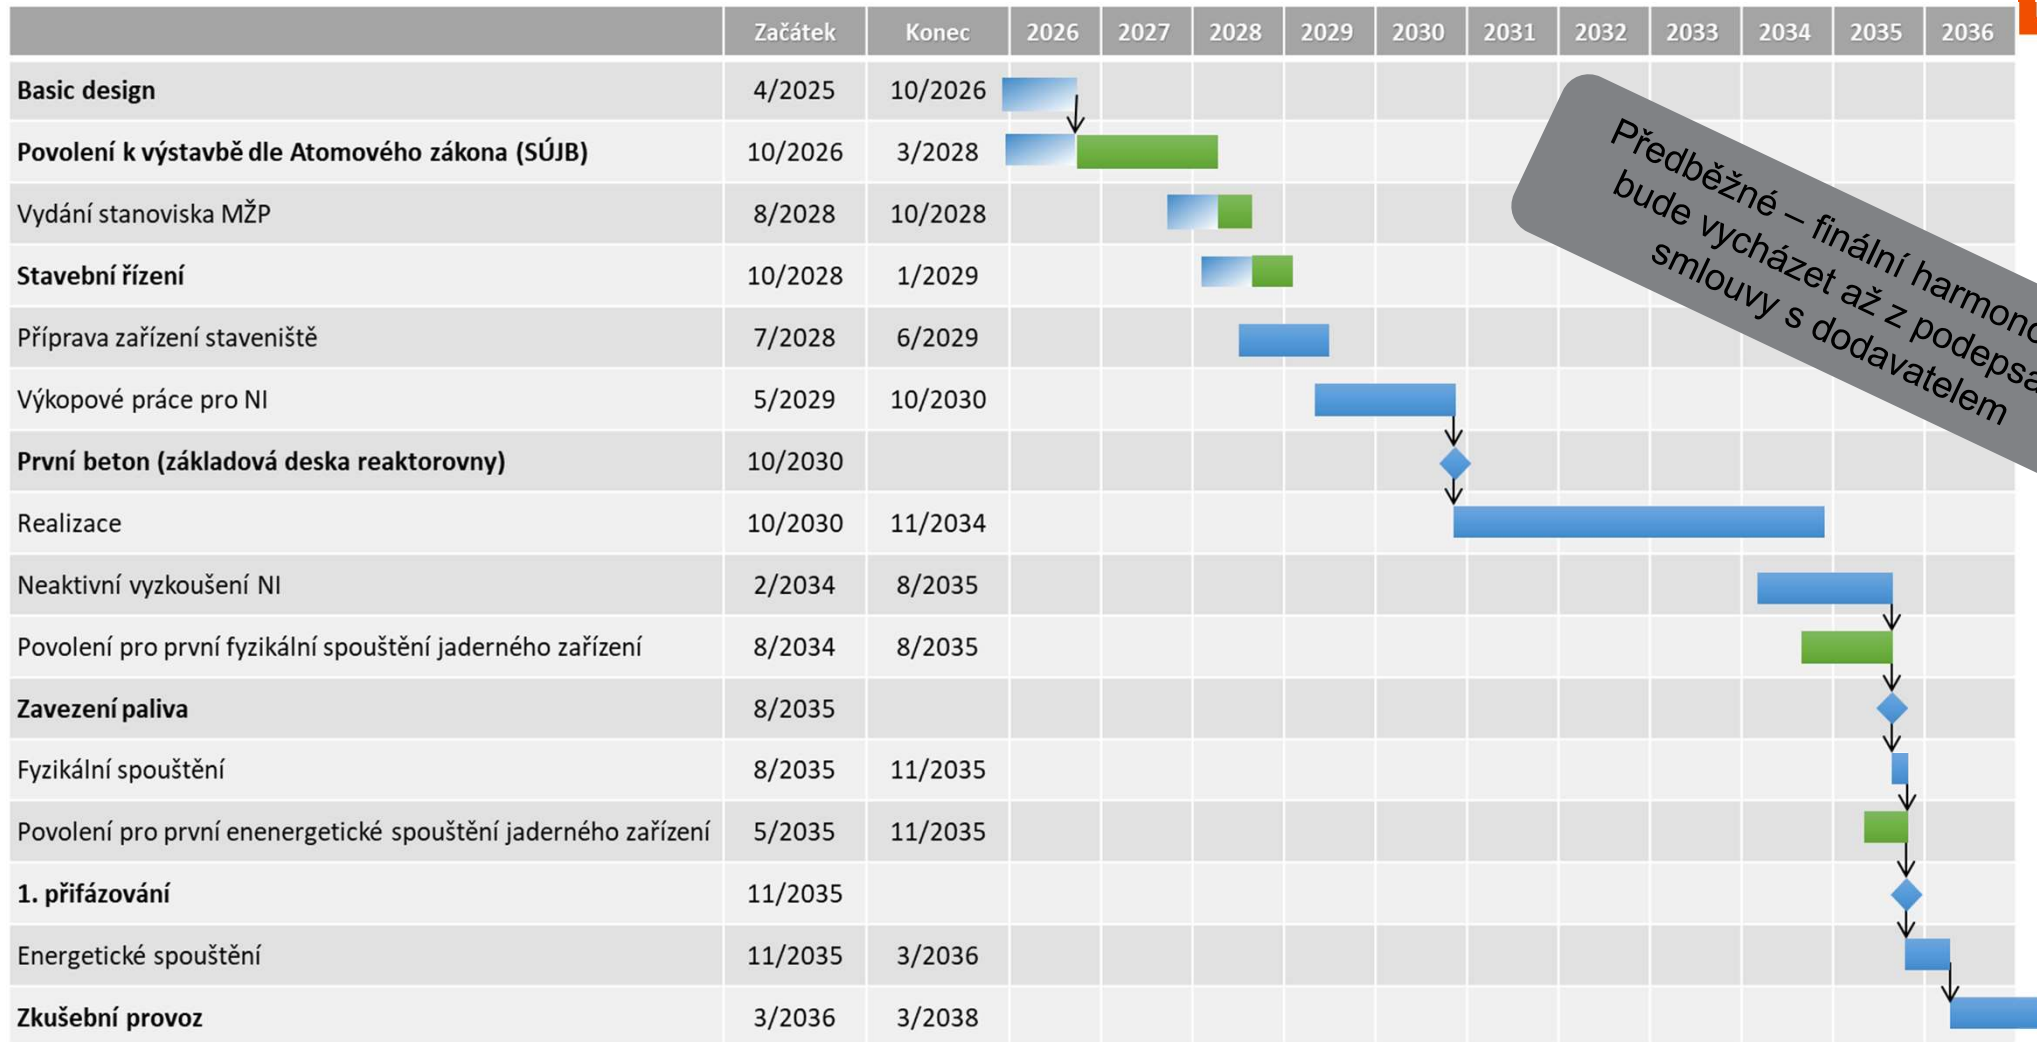

Předběžné – finální harmonogram bude vycházet až z podepsané smlouvy s dodavatelem





SMLOUVY UPRAVUJÍCÍ VZTAHY MEZI STÁTEM, ČEZ A EDU II

Klíčové transakční prvky, kterými se budou řídit práva a povinnosti stran ve vztahu k projektu NJZ a které, pokud se tak strany dohodnou, doplní, resp. nahradí První prováděcí smlouvu a Rámcovou smlouvu uzavřené 28. 7. 2020 mezi státem, ČEZ, a. s. („ČEZ“) a Elektrárnou EDU II, a. s. („EDU II“) představují:

A. Smlouva o výkupu elektřiny („PPA“) mezi Českou republikou (dále jen „stát“) zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu jako vykupujícím a společností EDU II jako dodavatelem, upravující zejména ujednání požadovaná pro PPA podle zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice;

B. Investorská smlouva („Investorská smlouva“) mezi státem, ČEZ a EDU II, upravující zejména závazek ČEZ poskytnout, až do dohodnuté částky a za podmínek uvedených v Investorské smlouvě, financování vlastního kapitálu projektu NJZ a podmínky prodeje/odkupu všech akcií EDU II při předem definovaných událostech;

C. Návrtná finanční výpomoc („NFV“, nebo „Státní půjčka“) poskytnutá Ministerstvem průmyslu a obchodu společnosti EDU II, představující závazek státu poskytnout peněžní prostředky v předem dohodnuté výši na financování fáze 2 (development) a fáze 3 (výstavba) projektu NJZ, případně dodatečně vzniklých vícenákladů pouze za předem definovaných podmínek.

PPA, Investorská smlouva a NFV budou podepsány ve stejnou dobu a žádný z těchto dokumentů nevstoupí v účinnost, dokud nebudou podepsány i všechny ostatní dokumenty, jakož i smlouva na dodávku elektrárny (EPC smlouva) a smlouva na dodávku paliva (NFC).

K PPA, Investorské smlouvě a NFV byly nyní připravené term-sheety. Shrnutí těchto term-sheetů je uvedeno v následujících sekcích této prezentace.





POVOLOVÁNÍ A LICENCOVÁNÍ

- **Hodnocení vlivu na životní prostředí**
 - Kladné stanovisko vydáno MŽP vydáno 30.8.2019, probíhá plnění podmínek.
- **Povolení k umístění (SÚJB dle Atomového Zákona)**
 - povolení vydáno 8.3.2021, probíhá plnění podmínek a příprava na seismickou misi MAAE v 06/2022.
- **Autorizace výroby (MPO dle Energetického Zákona)**
 - kladné stanovisko vydáno 27.4.2021.
- **Územní řízení (Stavební úřad MěÚ Třebíč dle Stavebního zákon) - probíhá**
 - celkem vydáno přes 900 stanovisek, vyjádření, rozhodnutí atd.
 - **Žádost podána na stavební úřad 1.6.2021**
 - MŽP 17.8. 2021 poslalo „Informace o předložení dokumentací pro územní řízení a probíhajících územních řízení“ do Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a Slovenska - lhůta k předání připomínek v českém jazyce na MěÚ Třebíč do 29.12. 2021;
 - Jako účastníci řízení se do územního řízení přihlásili nevládní organizace - námitky nevládních organizací z ČR byly uplatněny na SÚ do 29.9.2021;
 - MěÚ Třebíč požádal 22.11.2021 o prodloužení lhůty vydání ÚR do 1.6.2022;
 - Námitka k systémové podjatosti postoupil MěÚ Třebíč;
 - Děti Země podaly odvolání na KÚ Kraje Vysočina týkající se rozhodnutí o výjimce ochrany zvláště chráněných druhů živočichů – 3.2. MŽP odvolání zamítlo;
 - Začínáme zpracovávat územní studie, které budou podkladem ke změně ÚP obcí Dukovany, Rouchovany a Slavětice.





SPOLUPŮSOBENÍ STÁTU PŘI PŘÍPRAVĚ TRANSPORTNÍCH TRAS

- **Dokončení veřejnoprávní a majetkoprávní přípravy trvalých opatření** na trase dopravy nadrozměrných a těžkých komponent (NTK) dle usnesení vlády ČR č. 739 z 23.10.2017.
- Přijetí závazku státu k **zajištění financování a vlastní výstavby trvalých opatření** (na vodní i silniční cestě) v rozsahu trasy dopravy dohodnuté s vybraným EPC dodavatelem.
- Přijetí závazku státu k zajištění **nadlepšení vodního stavu na Labi** pro umožnění vodní dopravy NTK v úseku Hřensko -> Střekov.
- Přijetí závazku státu o **součinnosti** při veřejnoprávní a majetkoprávní přípravě při zajištění nezbytných **dočasných staveb na trase dopravy NTK**.
- Přijetí závazku státu (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, obce) k **financování přípravy, vlastní výstavby staveb na silniční dopravní infrastrukturu na návozdových trasách** komodit nutných pro výstavbu nového jaderného zdroje.

DĚKUJI ZA POZORNOST

Interní / Internal

